Жизненный цикл проекта

Проект: «СтройСервис» — веб-приложение строительной компании с конфигуратором дома и калькулятором ремонта.
Команда: 4–5 человек. **Срок:** 21 день.

1. Модель Киневин

Новизна — B . Аналогов много, ничего нового не изобретаем, делаем типовое решение под конкретного заказчика.

Технология — 1 . Обычный веб-стек, всё на готовых фреймворках.

Сложность — 2 . Много модулей: каталог, конфигуратор, калькулятор ремонта, заявка, PDF, админка. Каждый простой, но их надо связать в систему.

Темп — 2 . Жёсткий срок — 21 день, заказчик торопится.

Вывод: проект — «сборка из известных решений в сжатые сроки».

2. Agile Suitability Model

Оценка по 8 факторам (1–5):

Размер команды — 4.

Критичность — 3 (падение сайта не катастрофа, есть телефон).

Изменчивость требований — 5 (правила расчёта и состав конфигуратора ещё уточняются).


Опыт команды — 4 (стек знаком).

Распределённость — 5 (все в одном городе).

Культура заказчика — 3 (готов к итерациям, но не к долгим приёмкам).

Доступность заказчика — 3 (демо раз в неделю — реалистично).

Формализм документации — 2 (нужны инструкции, а не тома ТЗ).

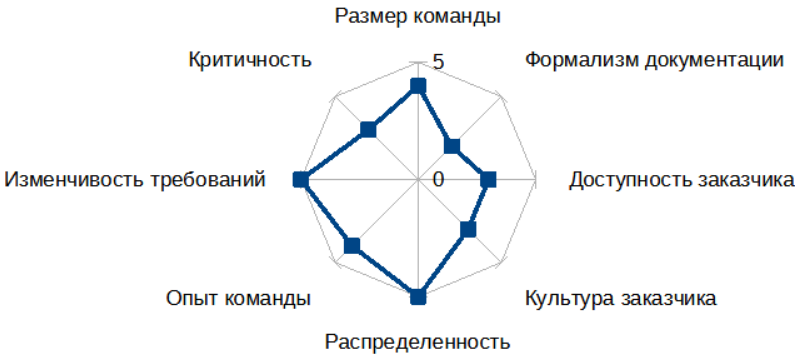

Анализ и выводы

На основе диаграммы можно сделать вывод, что проект имеет **смешанный профиль пригодности для Agile**. Есть как мощные предпосылки для внедрения гибких методологий, так и серьезные барьеры.

Факторы, благоприятствующие Agile (Зеленая зона):

•**Высокая изменчивость требований (5):** Agile создан именно для таких проектов. Жесткие методологии (Waterfall) здесь не сработают.
•**Низкий формализм документации (2):** Соответствует принципу «Работающий продукт важнее исчерпывающей документации».
•**Высокий опыт команды (4) и Доступность заказчика (4):** У команды есть компетенции для самоорганизации, а заказчик готов давать обратную связь.

Факторы риска и вызовы (Красная зона):

•**Высокая распределенность (5) и Большой размер команды (5):** Это главные барьеры. Agile требует тесной коммуникации и самоорганизующихся кросс-функциональных команд (обычно 5–9 человек). Большая распределенная команда столкнется с проблемами координации.
•**Низкая культура заказчика (2):** Заказчик может требовать фиксированного объема работ, жестких сроков и не понимать ценности итераций. Это приведет к конфликтам.
•**Высокая критичность (4):** В критичных системах (например, медицина, авиация, финансы) чистый Agile может быть рискован из-за необходимости строгого контроля качества, аудита и соответствия стандартам.

Средний балл: 3.6 / 5.
Вывод: Agile применим, но в «сжатом» виде — короткие итерации по 5–7 дней с демо в конце каждой недели. Плюсы — очень изменчивые требования и маленькая команда. Минусы — жёсткий срок и ограниченная доступность заказчика.

3. Собственные факторы

Фактор 1. Жёсткий срок при большом содержании.
21 день, а модулей 10+. Нужно:

оценить, что уложимся;

расставить приоритеты : конфигуратор, калькулятор ремонта, заявка, PDF, базовая админка; на потом — отзывы, расширенная админка;

заложить буфер 15–20%.

Фактор 2. Сложная логика расчёта стоимости.
Правила расчёта ещё не согласованы — это главный риск. Нужно:

вынести расчёт в отдельный модуль (движок цен), чтобы менять правила без переписывания всего;

получить от заказчика тестовые примеры «конфигурация → цена»;

зафиксировать правила на 1-й неделе.

Фактор 3. Зависимость от контента заказчика.
Фото, цены, тексты даёт заказчик — команда их не контролирует. Нужно:

работать на заглушках;

дедлайн передачи контента — не позднее 14-го дня;

наполнение вынести на 3-ю неделю, чтобы не блокировать разработку.

Фактор 4. Требование документации.
Заказчик ждёт инструкции и спецификации. Значит:

писать документацию параллельно разработке;

тестировать по ходу итераций;

заложить время на упаковку в буфер последней недели.

4. Вывод: как подходим к проекту

Гибридный подход.

Верхний уровень (объём, сроки, стоимость) — предиктивный: ИСР, оценки в часах, бюджет, график.

Разработка — Agile: 3 итерации по 7 дней, бэклог, сторипоинты, демо раз в неделю.

Изменения — адаптивный: журнал изменений, переприоритизация между итерациями.

Документация — параллельно разработке.

Что фиксируем жёстко:

срок 21 день;

команда 4 человека;

каталог проектов + конфигуратор дома + калькулятор ремонта + заявка + PDF-смета + базовая админка.

Что оставляем гибким:

отзывы, FAQ, портфолио «до/после», расширенная админка — приоритет «Could», делаем по остатку времени.
